

FADYM GROUPE

Service du Contrôle de Gestion

RAPPORT DE SUIVI BUDGÉTAIRE DE CHANTIER

Réhabilitation de l'École Primaire Publique KOESTREM

Riviera III — Commune de Cocody

Lot 2 du marché de réhabilitation des onze (11) écoles primaires publiques de la Commune
PV de réception provisoire n° 741/CC/SG/DST/2026 du 29 juillet 2026

Rapport établi le 19 août 2026

1. Synthèse

Le chantier de réhabilitation de l'École Primaire Publique K OESTREM (Riviera III), exécuté par la société E.F.P.C pour le compte de la mairie de Cocody, a fait l'objet d'une réception provisoire le 29 juillet 2026, sans réserve mentionnée au procès-verbal, pour un montant contractuel de 17 280 052 FCFA TTC.

Le suivi des dépenses de chantier sur la période du 2 avril au 27 juillet 2026 fait toutefois apparaître un total engagé de 17 730 182 FCFA, soit un dépassement de 450 130 FCFA (+ 2,60 %) non documenté au procès-verbal de réception.

Indicateur	Valeur	Repère
Montant du marché (budget alloué)	17 280 052 FCFA	100 %
Dépenses réalisées au 27/07/2026	17 730 182 FCFA	102,60 %
Écart (réalisé – budget)	+ 450 130 FCFA	+ 2,60 %
Part des matériaux dans les dépenses	14 517 892 FCFA	81,88 %
Part de la main-d'œuvre dans les dépenses	3 212 290 FCFA	18,12 %
Poids des 3 premiers postes matériaux	10 195 083 FCFA	57,50 %

2. Identification du projet

Intitulé du projet	Réhabilitation de l'École Primaire Publique K OESTREM (Riviera III)
Marché d'origine	Lot 2 du marché « Travaux de réhabilitation de onze (11) écoles primaires publiques de la Commune » — PV n° 741/CC/SG/DST/2026
Maître d'ouvrage	Mairie de Cocody — Direction des Services Techniques
Entreprise exécutante	Société E.F.P.C — 01 BP 13200 Abidjan 01
Suivi contrôle de gestion	Fadym Groupe
Nature des travaux	Travaux de réhabilitation (bâtiment scolaire)
Période d'exécution suivie	Du 2 avril 2026 au 27 juillet 2026
Réception provisoire	Prononcée le 29 juillet 2026, sans réserve mentionnée au PV
Date du rapport	19 août 2026

3. Réception provisoire des travaux

Le procès-verbal n° 741/CC/SG/DST/2026, établi le 29 juillet 2026 par la mairie de Cocody (Direction des Services Techniques), atteste que les travaux de réhabilitation de l'École Primaire Publique KOESTREM (Lot 2 du marché des onze écoles primaires publiques de la Commune) ont été examinés et vérifiés sur les lieux, en présence du représentant de la société E.F.P.C, Georges Ange AMANI.


Les signataires — Monsieur Ange René ETTIEN, Directeur des Services Techniques de la mairie de Cocody, pour le maître d'ouvrage, et le représentant de la société E.F.P.C pour l'entreprise — ont reconnu que les travaux ont été réalisés conformément au devis et aux normes techniques en vigueur, et ont prononcé leur réception, le montant total des travaux étant arrêté à 17 280 052 FCFA TTC, soit le montant exact du marché initial.

Portée de ce constat pour la suite de l'analyse. La réception provisoire ayant été prononcée sans réserve apparente et sur la base du montant contractuel initial, le dépassement budgétaire identifié à la section 4 n'est pas documenté au procès-verbal. Il devra donc faire l'objet d'une justification distincte auprès du maître d'ouvrage, probablement par avenant ou par décompte complémentaire.

4. Situation financière du chantier

Le tableau ci-dessous présente la comparaison entre le montant contractuel du marché et les dépenses effectivement engagées sur le chantier à la date d'établissement du présent rapport.

Rubrique	Montant
Montant du marché (budget alloué)	17 280 052 FCFA
Dépenses réalisées (réalisé)	17 730 182 FCFA
Écart (réalisé – budget)	+ 450 130 FCFA
Taux de dépassement	+ 2,60 %

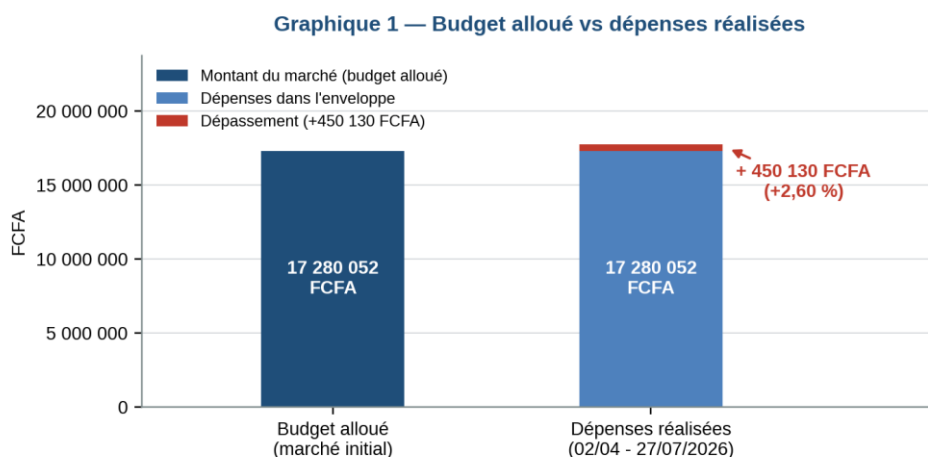

Graphique 1 — Le dépassement de 450 130 FCFA rapporté à l'enveloppe contractuelle de 17 280 052 FCFA.

Le chantier enregistre à ce jour un dépassement budgétaire de 450 130 FCFA, soit un taux de dépassement de 2,60 % par rapport au montant initial du marché. Ce taux reste contenu au regard du seuil d'alerte de 5 % couramment retenu en suivi de chantier, mais il excède la tolérance habituelle de gestion (généralement fixée entre 0 % et 2 %) et traduit un franchissement du seuil contractuel autorisé.

5. Détail des dépenses par nature (02/04/2026 au 27/07/2026)

Le relevé de dépenses transmis par le chantier, couvrant la période du 2 avril 2026 au 27 juillet 2026, permet de ventiler le montant total dépensé (17 730 182 FCFA) entre matériaux et main-d'œuvre, poste par poste. Les tableaux ci-après reprennent l'intégralité des postes, classés par montant décroissant.

5.1. Dépenses de matériaux


Poste de dépense	Montant	% du total
MATERIELS MENUISERIE	3 576 800 FCFA	20,17 %
MATERIELS DE PEINTURE	3 457 002 FCFA	19,50 %
MATERIELS ELECTRICITE	3 161 281 FCFA	17,83 %
MATERIELS DE PLOMBERIE	1 364 200 FCFA	7,69 %
MATERIELS FERRAILLE	660 000 FCFA	3,72 %
MATERIELS DE CHARPENTE	489 419 FCFA	2,76 %
MATERIELS DE PLATRE	454 200 FCFA	2,56 %
CADRES ET PORTES	408 000 FCFA	2,30 %
CIMENTS	402 500 FCFA	2,27 %
CARBURANT	218 750 FCFA	1,23 %
MATERIELS ETANCHEITE	126 000 FCFA	0,71 %
SABLE	100 000 FCFA	0,56 %
MATERIELS MACONNERIE	52 500 FCFA	0,30 %
AGGLOS	24 240 FCFA	0,14 %
MATERIELS DE NETTOYAGE	18 000 FCFA	0,10 %
CAROCOL	5 000 FCFA	0,03 %
TOTAL 1 — MATÉRIAUX	14 517 892 FCFA	81,88 %

5.2. Dépenses de main-d'œuvre

Poste de dépense	Montant	% du total
MAIN D'ŒUVRE PEINTRE	977 600 FCFA	5,51 %
MAIN D'ŒUVRE MAÇON	649 850 FCFA	3,67 %
MAIN D'ŒUVRE CHARPENTE	402 000 FCFA	2,27 %
MAIN D'ŒUVRE FERRAILLE	382 570 FCFA	2,16 %
MAIN D'ŒUVRE MENUISIER	304 820 FCFA	1,72 %
MAIN D'ŒUVRE ELECTRICIEN	171 200 FCFA	0,97 %
MAIN D'ŒUVRE NETTOYAGE / ÉVACUATION DE GRAVATS	126 460 FCFA	0,71 %
MAIN D'ŒUVRE PLOMBERIE	92 520 FCFA	0,52 %
MAIN D'ŒUVRE ETANCHEITE	60 320 FCFA	0,34 %
MAIN D'ŒUVRE CLIMATICIEN	30 800 FCFA	0,17 %
MAIN D'ŒUVRE CARRELAGE	7 150 FCFA	0,04 %
FRAIS DE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT	7 000 FCFA	0,04 %
TOTAL 2 — MAIN-D'ŒUVRE	3 212 290 FCFA	18,12 %
TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	17 730 182 FCFA	100,00 %

5.3. Structure des dépenses

Les matériaux représentent 14 517 892 FCFA, soit 81,88 % du total des dépenses, contre 3 212 290 FCFA (18,12 %) pour la main-d'œuvre. Cette répartition est cohérente avec un chantier de réhabilitation à forte composante de second œuvre : menuiserie, peinture, électricité et plomberie représentent à eux seuls plus de la moitié des dépenses.

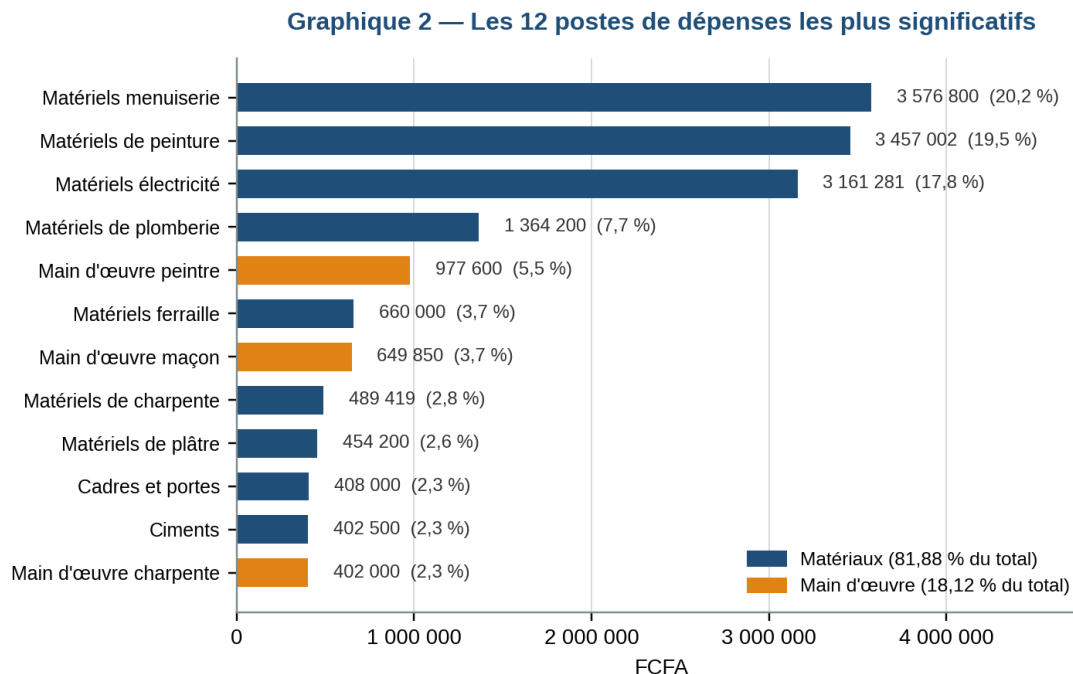

Graphique 2 — Postes de dépenses les plus significatifs, par nature (matériaux / main-d'œuvre).

5.4. Postes les plus significatifs

- **MATÉRIELS MENUISERIE : 3 576 800 FCFA (20,17 %) —** poste le plus élevé du chantier, cohérent avec des travaux de réhabilitation (portes, huisseries, faux-plafonds).
- **MATÉRIELS DE PEINTURE : 3 457 002 FCFA (19,50 %) —** deuxième poste, à confronter avec les quantités réellement mises en œuvre.
- **MATÉRIELS ÉLECTRICITÉ : 3 161 281 FCFA (17,83 %) —** troisième poste, à vérifier au regard du cahier des charges initial (mise aux normes électriques éventuellement non prévue au devis d'origine).
- **MAIN-D'ŒUVRE PEINTRE : 977 600 FCFA (5,51 %) —** poste de main-d'œuvre le plus élevé, cohérent avec l'ampleur du poste peinture en matériaux.

Ces trois premiers postes de matériaux (menuiserie, peinture, électricité) cumulent à eux seuls 10 195 083 FCFA, soit 57,5 % du total des dépenses du chantier. Ils constituent la priorité d'investigation pour expliquer le dépassement budgétaire constaté.


6. Reportage photographique du chantier

6.1. État des lieux avant travaux

Les photographies suivantes, prises avant le démarrage des travaux, illustrent l'état de dégradation des infrastructures ayant justifié l'intervention : sanitaires hors d'usage, portes et menuiseries endommagées par les termites et l'humidité, plomberie détériorée, peintures dégradées et façades encrassées.



Sanitaires « Filles / Garçons » — portes dégradées, cuvette apparente

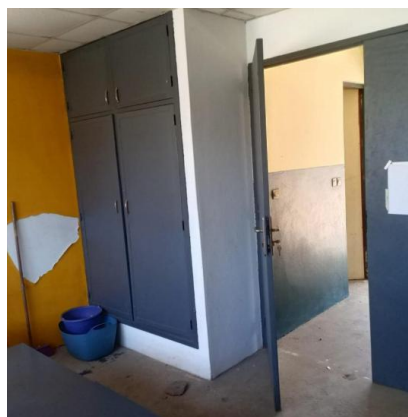


Salle de classe — placards et porte métallique avant réhabilitation



Local annexe — façade en claustra et porte extérieure dégradée



Détail d'une porte extérieure rongée par l'humidité et les termites

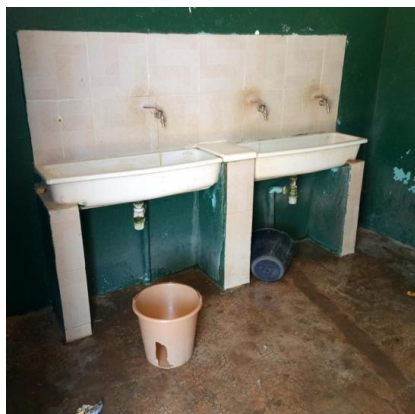

Bloc sanitaire — lavabos et robinetterie hors d'usage



Façade extérieure du bâtiment — peinture écaillée et murs encrassés

6.2. Travaux en cours d'exécution

Les photographies suivantes, prises en cours de chantier, illustrent l'avancement des travaux : pose du plafond en contreplaqué, mise en peinture des soubassements et des murs intérieurs, et pose de la toiture métallique.



Pose du plafond en contreplaqué dans une salle de classe — structure de charpente apparente



Plafond en contreplaqué achevé — assemblage des pans et poutres peintes en blanc



Application de la peinture sur le soubassement extérieur du bâtiment



Pose et étanchéité de la toiture métallique (bac acier rouge)



Travaux d'enduit et de finition sur les murs intérieurs

Ces prises de vue attestent de l'exécution effective des principaux postes de travaux identifiés au détail des dépenses (section 5), notamment la menuiserie et la charpente, la peinture et la toiture.

6.3. État final à l'issue des travaux

Les photographies ci-dessous présentent l'état des ouvrages à l'issue des travaux de réhabilitation. Elles permettent de constater visuellement les principales réalisations et la remise en état des accès, des portes et des sanitaires.



Façade et soubassement extérieur après travaux



Portail d'accès de l'établissement après réhabilitation



Porte métallique intérieure après réhabilitation



Sanitaire après réhabilitation — carrelage et équipement WC

Ces prises de vue de fin de travaux complètent les photographies d'état initial et d'avancement présentées précédemment et constituent un élément visuel de constat de la remise en état.

7. Constats du contrôle de gestion

- Le montant total des travaux réceptionnés au PV (17 280 052 FCFA TTC) correspond exactement au montant du marché initial, confirmant qu'aucun avenant n'a été formalisé à la date de la réception provisoire (29 juillet 2026).
- Le dépassement, de 450 130 FCFA en valeur absolue, excède la tolérance habituelle de gestion de chantier (généralement fixée entre 0 % et 2 %), même s'il reste en deçà du seuil d'alerte de 5 %.
- En l'absence d'avenant signé postérieurement à la réception provisoire, ce surcoût de 450 130 FCFA reste, à ce stade, à la charge de l'entreprise exécutante (E.F.P.C), sauf régularisation ultérieure avec la mairie de Cocody.

8. Recommandations

8.1. Actions immédiates — clôture du dossier Koestrem

- Prioriser le rapprochement entre le DQE initial et les dépenses réelles sur les trois postes matériaux les plus significatifs (menuiserie, peinture, électricité), qui concentrent 57,5 % du total des dépenses.
- Vérifier l'existence d'un avenant ou d'un ordre de service modifiant le montant contractuel initial.
- Solliciter, si nécessaire, une régularisation contractuelle (avenant) auprès du maître d'ouvrage pour couvrir le surcoût constaté.

8.2. Actions structurelles — dispositif de suivi des chantiers

- Renforcer le suivi hebdomadaire des dépenses de chantier par un tableau de bord budgétaire, afin de détecter plus tôt tout risque de dérive.
- Documenter et archiver toutes les pièces justificatives des dépenses pour fiabiliser les prochains rapports de contrôle.

9. Conclusion

Le chantier de réhabilitation de l'École Primaire Publique KOESTREM (Riviera III), Lot 2 du marché de réhabilitation des onze écoles primaires publiques de la Commune de Cocody, a fait l'objet d'une réception provisoire le 29 juillet 2026 (PV n° 741/CC/SG/DST/2026), les travaux ayant été jugés conformes au devis et aux normes techniques en vigueur, pour un montant contractuel de 17 280 052 FCFA TTC.

Le suivi budgétaire du contrôle de gestion fait toutefois apparaître un dépassement de 450 130 FCFA (+ 2,60 %) par rapport à ce montant contractuel, non documenté au PV de réception. Ce dépassement, bien que modéré, nécessite une investigation complémentaire afin d'en déterminer précisément les causes et de statuer sur sa prise en charge (avenant, marge de l'entreprise, ou négociation avec le maître d'ouvrage). Un suivi renforcé est recommandé jusqu'à la clôture financière définitive du dossier.
